

균형발전국

제347회 임시회
2022. 7. 15. ~ 7. 28.

*

건설교통과

목 차


I . 기본현황	3
II . 2022년도 상반기 주요업무 추진실적	5
III . 2022년도 군정 주요 현안 사업	7
1. 충청내륙고속화도로 조기 추진	7
2. 용산~서충주IC 간 국지도 시설개량사업	9
3. 금왕~삼성 간 지방도 4차로 확장사업	11
4. 평곡~석인 간 지방도 4차로 확장사업	13
5. 원남~혁신도시 간 지방도 정비사업	15
6. 신돈~쌍정 간 지방도 4차로 확장사업	17
7. 대소~삼성 간 4차선 지방도 확포장사업	19
8. 화물자동차 공영차고지 조성사업	21
9. 충북혁신도시 공영주차장 조성사업	23
IV . 서면보고자료	25
1. 도로인프라 구축을 위한 군도 확포장사업	25
2. 영농환경 개선을 위한 농어촌도로 건설사업	26
3. 안전하고 쾌적한 도로 유지관리	27

I. 기 본 현 황

1

기구 및 인력

□ 기 구: 1과 4팀

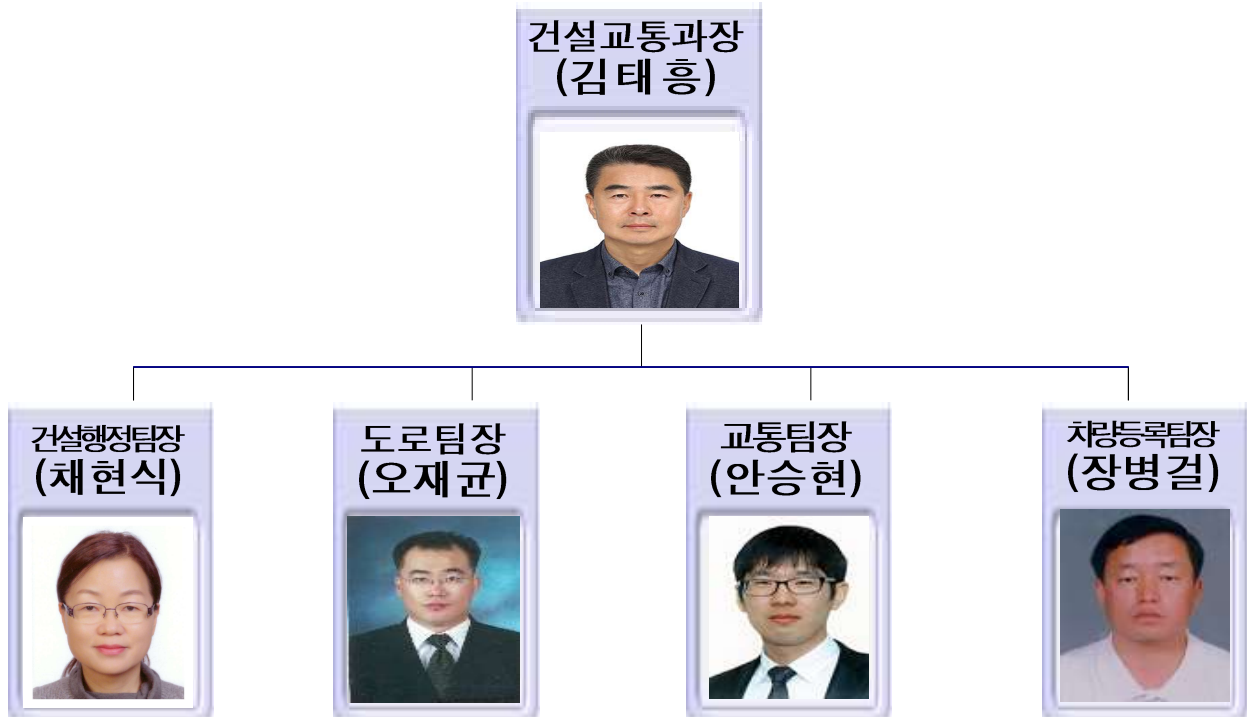

□ 인 력 : 정원 26명 / 현원 25명

구 분	계	일 반 직							청경	무 기 계약직 기 타
		소계	4급	5급	6급	7급	8급	9급		
합 계	43	25		1	6	5	8	5		18
건설 행정 팀	8	7		1	2	2	1	1		1
도 로 팀	17	5			2	1	2			12
교 통 팀	9	7			1	2	1	3		2
차 량 등 록 팀	9	6			1		4	1		3

※ 정원외 인력: 무기계약직 18명

2

주요기능

건설행정팀

- ❖ 공공용지 취득 보상, 도로점용·굴착허가 및 도로불법점용 단속
- ❖ 국·공유재산 관리, 제한차량운행허가 및 위반차량 단속

도로팀

- ❖ 군도·농어촌도로 확포장사업, 위험도로 구조개선 사업
- ❖ 어린이·노인 보호구역관리 교통사고 잦은 곳 개선 사업

교통팀

- ❖交通安全시설 관리, 사업용 차량 지원 관리, 자동차정비업
- ❖ 불법 주정차 단속, 무단방치 자동차 처리, 주차장 관리

차량등록팀

- ❖ 자동차등록(신규·이전·압류·저당 등) 및 자동차매매업 관리
- ❖ 자동차 과태료 관리 및 건설기계 등록 관리

3

예산규모

☐ 일반회계: 25,889백만원(군 예산의 3.39%)

(단위: 백만원)

구 분	2022년 본예산	2021년 본예산	증 감(%)
계	25,889	20,108	5,781(28.7%)
건설행정팀	98	81	17(20.9%)
도로팀	11,238	6,303	4,935(78.3%)
교통팀	14,152	12,354	1,798(14.6%)
차량등록팀	114	50	64(128%)
행정운영경비	45	40	5(12.5%)
주차장특별회계출전	242	1,280	△1,038(△81.1%)

☐ 주차장특별회계: 303백만원(군 예산의 0.04%)

II. 상반기 주요업무 추진실적

□ 건설교통과

(단위 : 백만원)

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도(%)
충청내륙 고속화도로건설	(1-2공구) L=12.6km 도안 화성~원남 하당 (2공구) L=13.3km 원남 하당~소이 후미	746,648	· 용지보상 협의 및 사업추진	65
대소~삼성 간 지방도 확포장	(1단계) L=3.05km 삼성 천평~삼성 양덕	30,869	· 용지보상 협의 및 사업추진 · 문화재 발굴 조사 중	80
국지도 49호선 2차선 시설개량	2차선 시설개량사업 L=5.5km, B=11.0m	34,600	· 설계예산 2억원 확보되어 기본 및 · 실시설계용역 준비 중 (6월중 설계용역 발주예정)	-
금왕~삼성 간 지방도 4차로 확장	도로확포장사업 L=8.2km(2차로→4차로)	82,200	· 실시설계용역 진행중으로 23년말 · 설계완료 예정	-
평곡~석인 간 지방도 4차로 확장	도로확포장사업 L=3.0km(2차로→4차로)	39,450	· 타당성평가 마무리 중으로 7월중 · 기본 및 실시설계 발주예정	-
신돈~쌍정 간 지방도 4차로 확장	도로확포장사업 L=3.05km(2차로→4차로)	34,000	· 기본 및 실시설계용역 중으로 · 23년 보상협의 예정	-
군도건설사업	음성군 관내 4개노선 L=3.8km 2차로	2,050	· 관내 군도 노선 4개소에 대하여 · 토지보상 및 공사 진행 중	50
농어촌도로건설사업	음성군 관내 8개노선 L=5.8km 2차로	3,500	· 관내 군도 노선 8개소에 대하여 · 토지보상 및 공사 진행 중	30

사업명	사업내용	사업비	추진실적	
			추진내용	진도 (%)
군도 유지보수사업	음성군 관내 군도 시설물 유지보수	1,530	· 관내 군도 아스콘 덧씌우기 및 차선도색공사 완료 · 도로표지판 및 과속방지턱 설치 완료 · 배수개선 및 선형개량공사 완료	80
농어촌도로 유지보수사업	-음성군 관내 농어촌도로 시설물 유지보수 -교량 유지보수 및 안전점검	1,680	· 관내 농어촌도로 차선도색공사 완료 · 과속방지턱 및 배수로정비 등 유지보수공사 완료 · 상반기 교량 안전점검 완료	50
화물자동차 공영차고지 조성사업	금왕읍 성본산업단지 내 공영화물차고지 300면 조성	12,400	· 토지중도금 지급	30
충북혁신도시 공영주차장 조성사업	충북혁신도시 내 공영주차장 194면 조성	5,900	· 기초 터파기 · 잡석지정 및 무큰 Con' c타설 · 기초 Con' c타설	50
고객만족이 최우선인 차량행정 실현	홈페이지를 통한 홍보강화, 매매업 지도점검, 불법주기 현장계도 및 수시 단속	-	· 자동차, 건설기계 등록 6,151대 · 건설기계조종사면허증발급 342건 · 자동차관리사업(매매업) 지도점검 1회 · 건설기계관리사업 일제점검 1회 · 범규위반자 과태료부과 192백만원 · 무보험차량운행 사건처리 57건	100
(특수시책) 택시운수종사자 특별교육 실시	택시 운수종사자 특별교육을 통해 친절서비스 향상 및 택시 운송질서 확립	8	· 특별교육 실시 계획 수립하여 11월 ~ 12월중 교육실시 예정	-
(특수시책) 디자인 교통안전시설물 시범 설치 사업	기존 교통안전 개선을 위한 교통안전시설물 시범 설치·운영	60	· 설계검토 중 · 7월 중 시설물 설치·운영 예정	-

Ⅲ. 2022년도 주요 현안 사업

1. 충청내륙고속화도로 조기 추진

- ◆ 위 치: 청주 북이 금암 ~ 제천 봉양 장평
- ※ 음성군 통과구간
 - (1-2공구) 도안 화성~원남 하당(L=12.6km)
 - (2공구) 원남 하당~소이 후미(L=13.3km)
- ◆ 사업기간: 2011. ~ 2026.
- ◆ 규 모: L=57.6km, B=20m(왕복 4차로)
- ◆ 총사업비: 746,648백만원(국비 100%)
- ◆ 공정률(이행률): 65% ◆ 완료시기: 2026. 12.

□ 필 요 성

- 청주~제천 구간의 간선도로 기능 제고를 위한 교통인프라를 확충하여 충청내륙권 경제 활성화에 기여
- 세종~충북~강원권 주요 도시 간 접근 통행시간 단축 도모

□ 추진상황

- 제1-1공구, 제1-2공구 공사 착공 17. 5.
- 제1-1공구, 제1-2공구 도로구역결정고시 17. 6.
- 제1-1공구, 제1-2공구 용지보상 실시 17. 10.
- 제2공구, 제3공구 공사 착공 18. 7.
- 제2공구, 제3공구 용지보상 실시 18. 10
- 음성 제2교차로 개선 건의 19. 2.
- 대전지방국토관리청, 도내 시·군 업무협약 19. 5.
- 제4공구 공사 착공, 용지보상 실시 20. 6.

□ 향후계획

- 용지보상 및 공사 계속 추진
- 사업 준공 26. 12.

□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	746,648	707,336	1,151	2,000	36,161
국 비	746,648	707,336	1,151	2,000	36,161

부서/팀	건설교통과 / 건설행정팀	담당자	행정6급 이영석	전화번호	871-3862
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 조감도



2. 용산~서충주IC 간 국지도 시설개량사업

- ◆ 위 치: 음성군 음성읍 용산리 ~ 충주시 신니면 대화리
- ◆ 사업기간: 2022. ~ 2025.
- ◆ 총사업비: 34,600백만원 (국비 70%, 도비 30%)
- ◆ 사업내용: 2차선 시설개량사업 L=5.5km, B=11.0m
- ◆ 공정률(이행률): -% 설계중

☐ 추진상황

- 「제5차 국도·국지도 5개년 계획(21~25)」 대상지 선정 20. 1.
- 「제5차 국도·국지도 5개년 계획(21~25)」 사업확정 21. 9.
- 기본 및 실시설계 22. 6.

☐ 향후계획

- 공사착공 24. 3.
- 공사준공 25. 12.

☐ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	34,600	-	200	1,000	33,400
국 비	24,200	-	200	1,000	23,000
도 비	10,400	-	-	-	10,400
군 비	-	-	-	-	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	건설교통과 / 도로팀	담당자	시설6급 김덕원	전화번호	871-3872
------	-------------	-----	----------	------	----------

3. 금왕~삼성 간 지방도 4차로 확장사업

- ◆ 위 치: 충북 음성군 금왕읍 내송리 ~ 삼성면 양덕리 일원
- ◆ 사업기간: 2018. ~ 2027.
- ◆ 총사업비: 82,200백만원 (도비 100%)
- ◆ 사업내용: 도로확포장사업 L=8.2km (2차로 → 4차로)
- ◆ 공정률(이행률): -% 설계중

□ 추진상황

- 충청북도 노선(안) 협의 17. 12.
- 타당성 평가용역 및 기본계획 용역 발주 19. 6.
- 실시설계용역 발주 21. 12.

□ 향후계획

- 실시설계용역 준공 23. 12.
- 보상 및 행정절차 이행 24. 1.
- 공사착공 25. 1.


□ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	82,200	1,000	1,500	4,000	75,700
국 비	-	-	-	-	-
도 비	82,200	1,000	1,500	4,000	75,700
군 비	-	-	-	-	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	건설교통과 / 도로팀	담당자	시설6급 김덕원	전화번호	871-3872
------	-------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

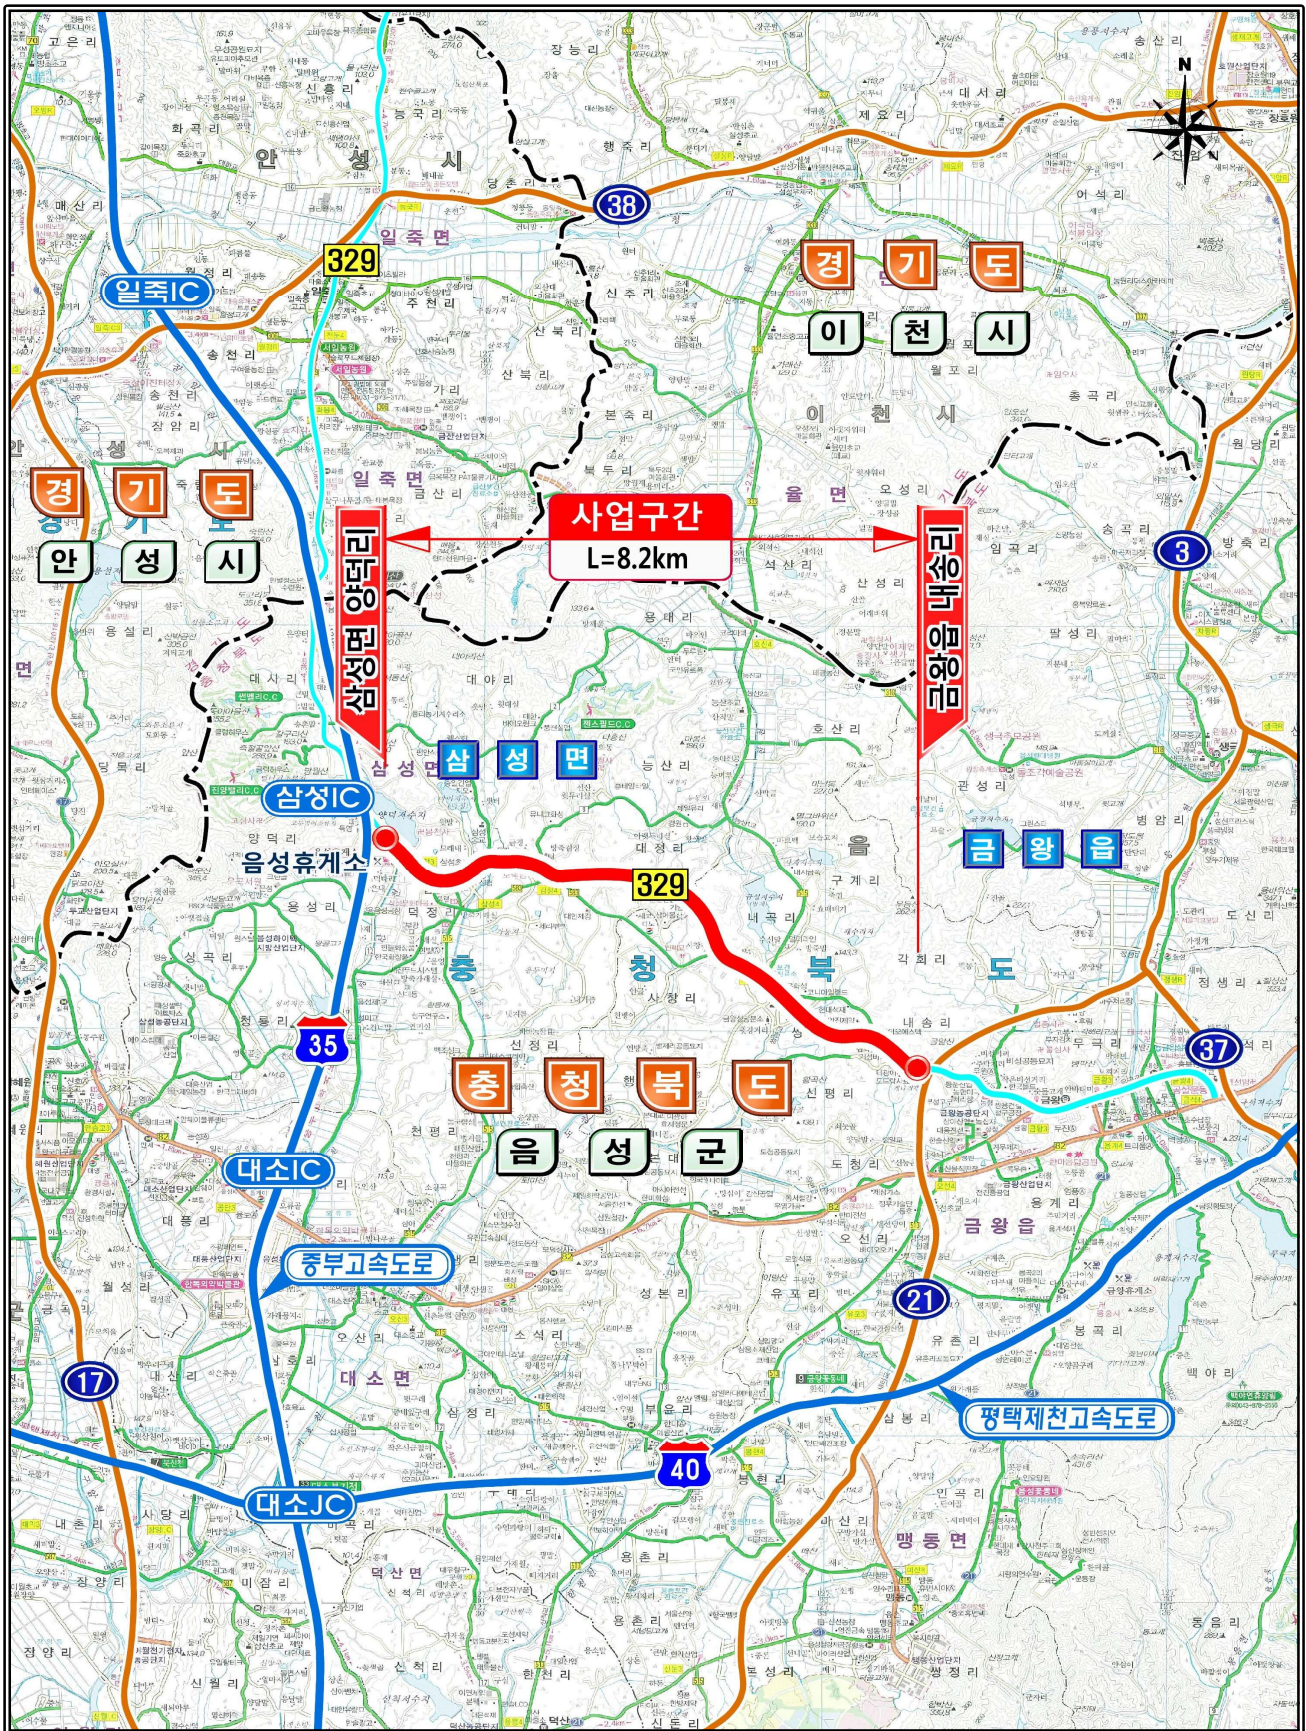

4. 평곡~석인 간 지방도 4차로 확장사업

- ◆ 위 치: 충북 음성군 음성읍 평곡리 ~ 석인리
- ◆ 사업기간: 2021. ~ 2026.
- ◆ 총사업비: 39,450백만원 (도비 100%)
- ◆ 사업내용: 도로확포장 L=3.0km, 2차로 → 4차로
- ◆ 공정률(이행률): -% 설계중

☐ 추진상황

- 충청북도 도로건설 5개년계획 반영건의 20. 8.
- 충청북도 도로건설관리계획(21~25) 고시 21. 7.
- 타당성 평가용역 21. 11.

☐ 향후계획

- 기본 및 실시설계용역 발주 22. 7.
- 보상 및 행정절차 이행 24. 1.
- 공사착공 25. 3.

☐ 투자계획


(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	39,450	200	-	3,000	36,250
국 비	-	-	-	-	-
도 비	39,450	200	-	3,000	36,250
군 비	-	-	-	-	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	건설교통과 / 도로팀	담당자	시설6급 김덕원	전화번호	871-3872
------	-------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도

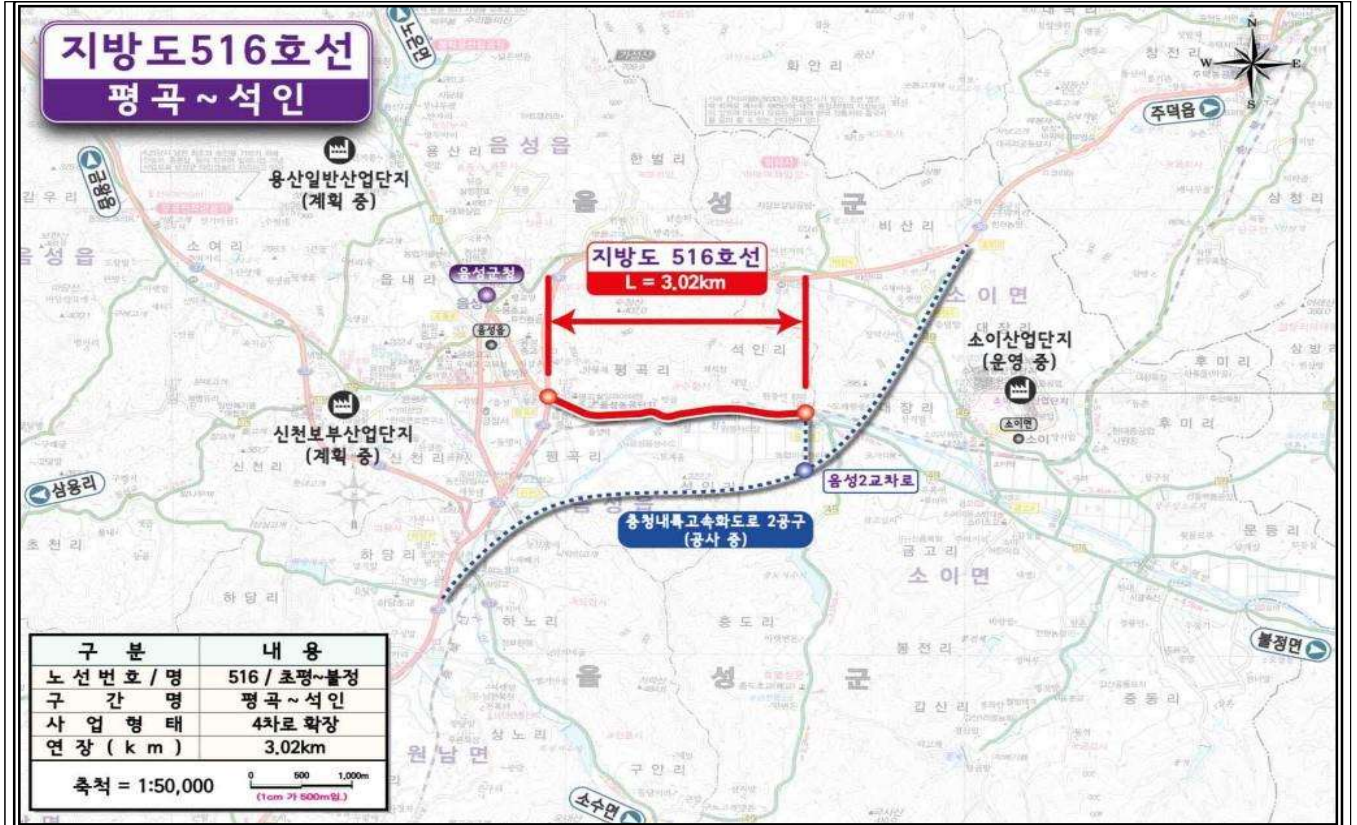

□ 전경사진



- ◆ 위 치: 지방도 533호선(원남 삼용리~맹동 두성리)
- ◆ 사업기간: 2026. ~ 2030.
- ◆ 총사업비: 180억원 (도비 100%)
- ◆ 사업내용: 도로개설 L=1.0km(터널 500m포함), 선형개량 2개소
- ◆ 공정률(이행률): 0% ◆ 완료시기: 미정

○ 지방도 533호선 확포장 반영 군계획 고시	16. 3. 10.
○ 지방도 533호선 시설개량 건의	19. 12.
○ 지방도 533호선 시설개량 건의	20. 8.
○ 지방도 533호선 정비사업(터널개설) 도 인수위 건의	22. 6.


- 도 도로건설관리계획('26~' 30)에 반영 추진
- 충북 도로관리사업소와 지속 협의

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	18,000	-	-	-	18,000
균 특	-	-	-	-	-
도 비	18,000	-	-	-	18,000
군 비	-	-	-	-	-
특교세	-	-	-	-	-


- 15 -

위치도 및 조감도

□ 위치도

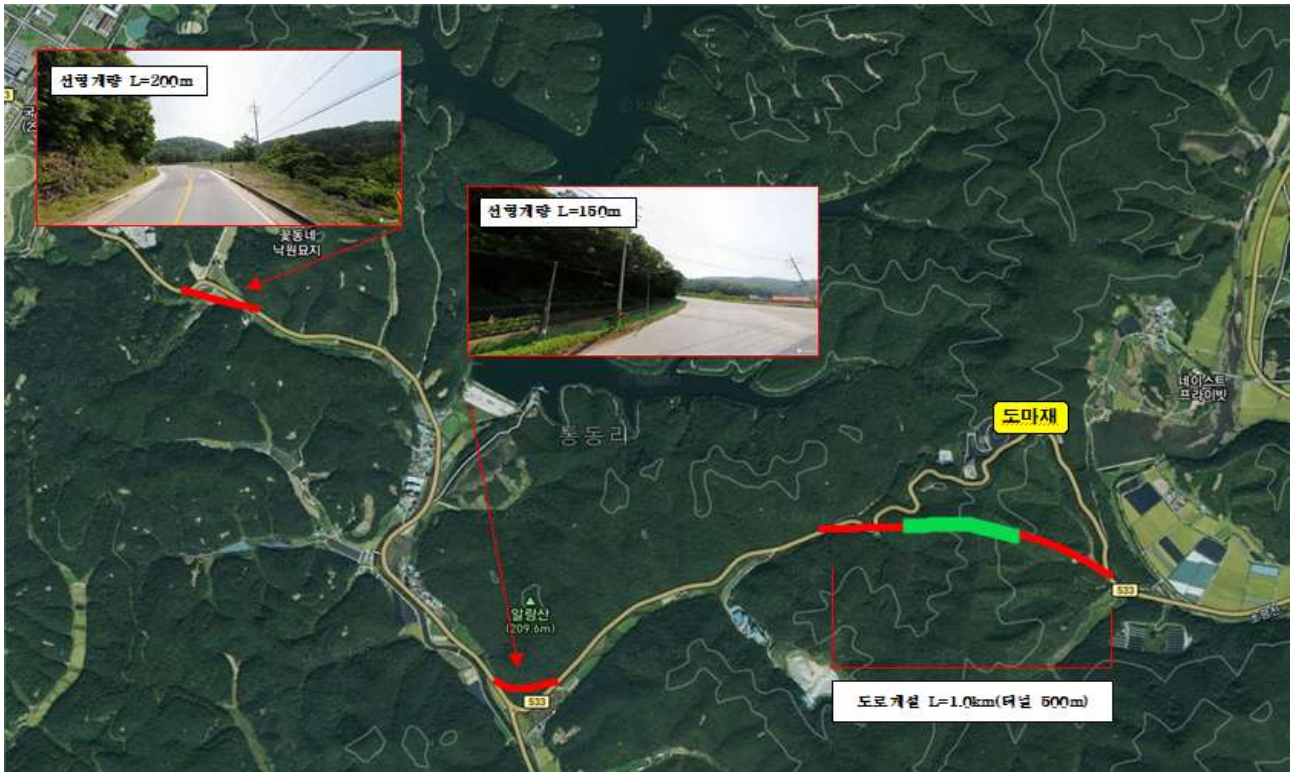

□ 조감도

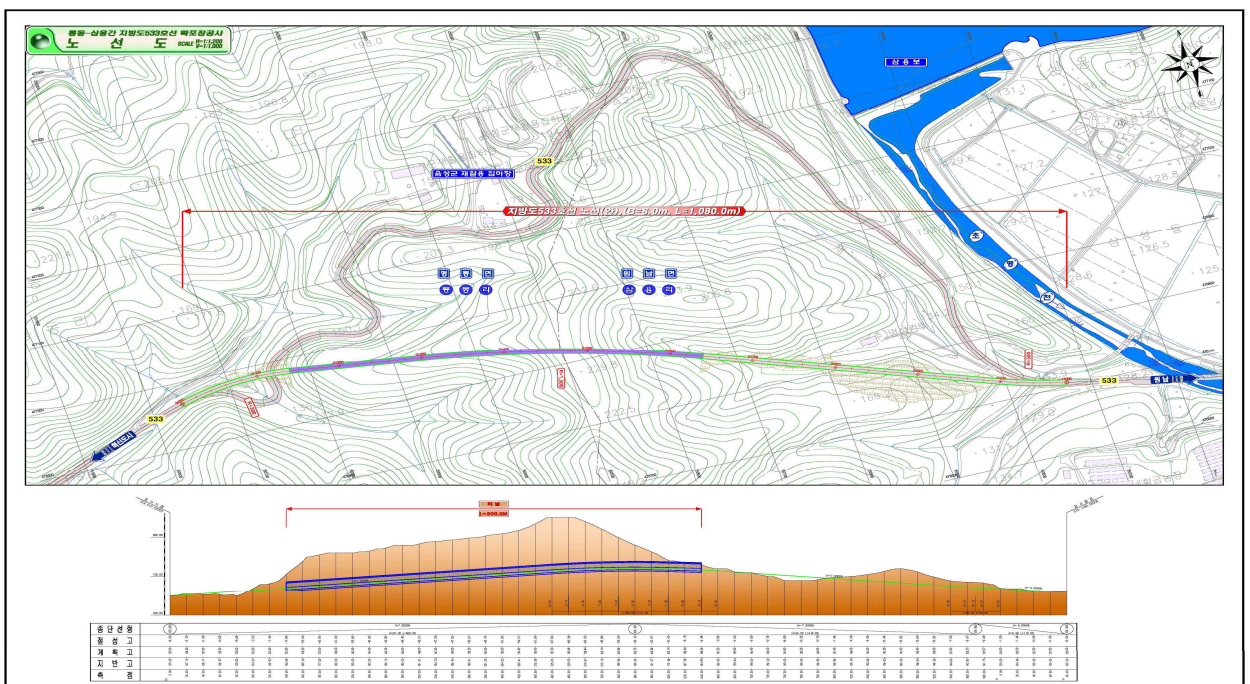

6. 신돈~쌍정 간 지방도 4차로 확장사업

- ◆ 위 치: 충북 음성군 맹동면 신돈리 ~ 쌍정리
- ◆ 사업기간: 2020. ~ 2028.
- ◆ 총사업비: 34,000백만원 (도비 100%)
- ◆ 사업내용: 도로확포장 L=3.05km, 2차로 → 4차로
- ◆ 공정률(이행률): -% 설계 중

☐ 추진상황

- 충북형 뉴딜사업 선정 20. 6.
- 타당성 평가용역 발주 21. 1.
- 기본 및 실시설계용역 발주 22. 3.

☐ 향후계획

- 보상 및 행정절차 이행 23. 3.
- 공사착공 24. 3.

☐ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	34,000	1,600	-	3,000	29,400
국 비	-	-	-	-	-
도 비	34,000	1,600		3,000	29,400
군 비	-	-	-	-	-
민 간	-	-	-	-	-

부서/팀	건설교통과 / 도로팀	담당자	시설6급 김덕원	전화번호	871-3872
------	-------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도



7. 대소~삼성 간 4차선 지방도 확포장사업

- ◆ 위 치: 삼성면 천평리~삼성면 양덕리(1단계, L=3.05km) / 지방도513
- ※ 2단계 구간: 삼성면 천평리 ~ 대소면 태생리(L=2.87km / 미정)
- ◆ 사업기간: 2011. ~ 2022.
- ◆ 규 모: L=3.05km, B=16.5~25.0m(왕복 4차로)
- ◆ 총사업비: 30,869백만원(도비 100%)
- ◆ 공정률(이행률): 80% ◆ 완료시기: 2022. 12

☐ 필 요 성

- 대소면·삼성면 일원 입주기업 및 성본산단 등 연계 도로망 구축
- 도로망 확충으로 지역개발 촉진 및 지역경제 활성화

☐ 추진상황

- 도로구역 결정(변경)고시 15. 12.
- 공사착공 16. 2.
- 용지보상 실시 16. 9.
- 문화재 표본조사 실시 17. 9.
- 보상지원추진협의회 개최 18. 12.
- 토지수용(1차) 완료 19. 4.
- 토지수용(2차) 완료(삼성농원) 19. 12.
- 토지수용(3차) 완료 20. 3.
- 삼성농원 행정소송 화해권고 결정(보상비 증액) 21. 7.
- 문화재 발굴 조사 22. 4.

☐ 향후계획

- 삼성농원 조경수 이식 22. 10.
- 사업 준공 22. 12.

☐ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	30,869	27,690	3,179	-	-
도 비	30,869	27,690	3,179	-	-

부서/팀	건설교통과 / 건설행정팀	담당자	행정6급 이영석	전화번호	871-3862
------	---------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 사진대지

☐ 위치도



☐ 사진대지



- ◆ 위 치: 대소면 성본리(성본산업단지 내)
- ◆ 사업기간: 2019. ~ 2023.
- ◆ 규 모: 33,576m² / 주차 300면, 관리동 등
- ◆ 총사업비: 12,400백만원 (도비 70%, 군비 30%)
- ◆ 사업내용: 화물자동차 공영차고지 조성
- ◆ 공정률(이행률): 30% ◆ 완료시기: 2023. 12.


○ 부지매입 계약(성본사업단지)	19.	6.
○ 부지중도금 지급(85%)	22.	3.

○ 기본 및 실시설계용역 착수	22. 8.
○ 공영차고지 설치 및 운영계획 인가	22. 11.
○ 착공	23. 3.
○ 준공	23. 12.

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	12,400	5,169	1,807	5,424	-
국 비	1,220	1,220	-	-	-
도 비	7,460	2,400	1,265	3,795	-
군 비	3,720	1,549	542	1,629	-
민 간	-	-	-	-	-

– 21 –

위치도

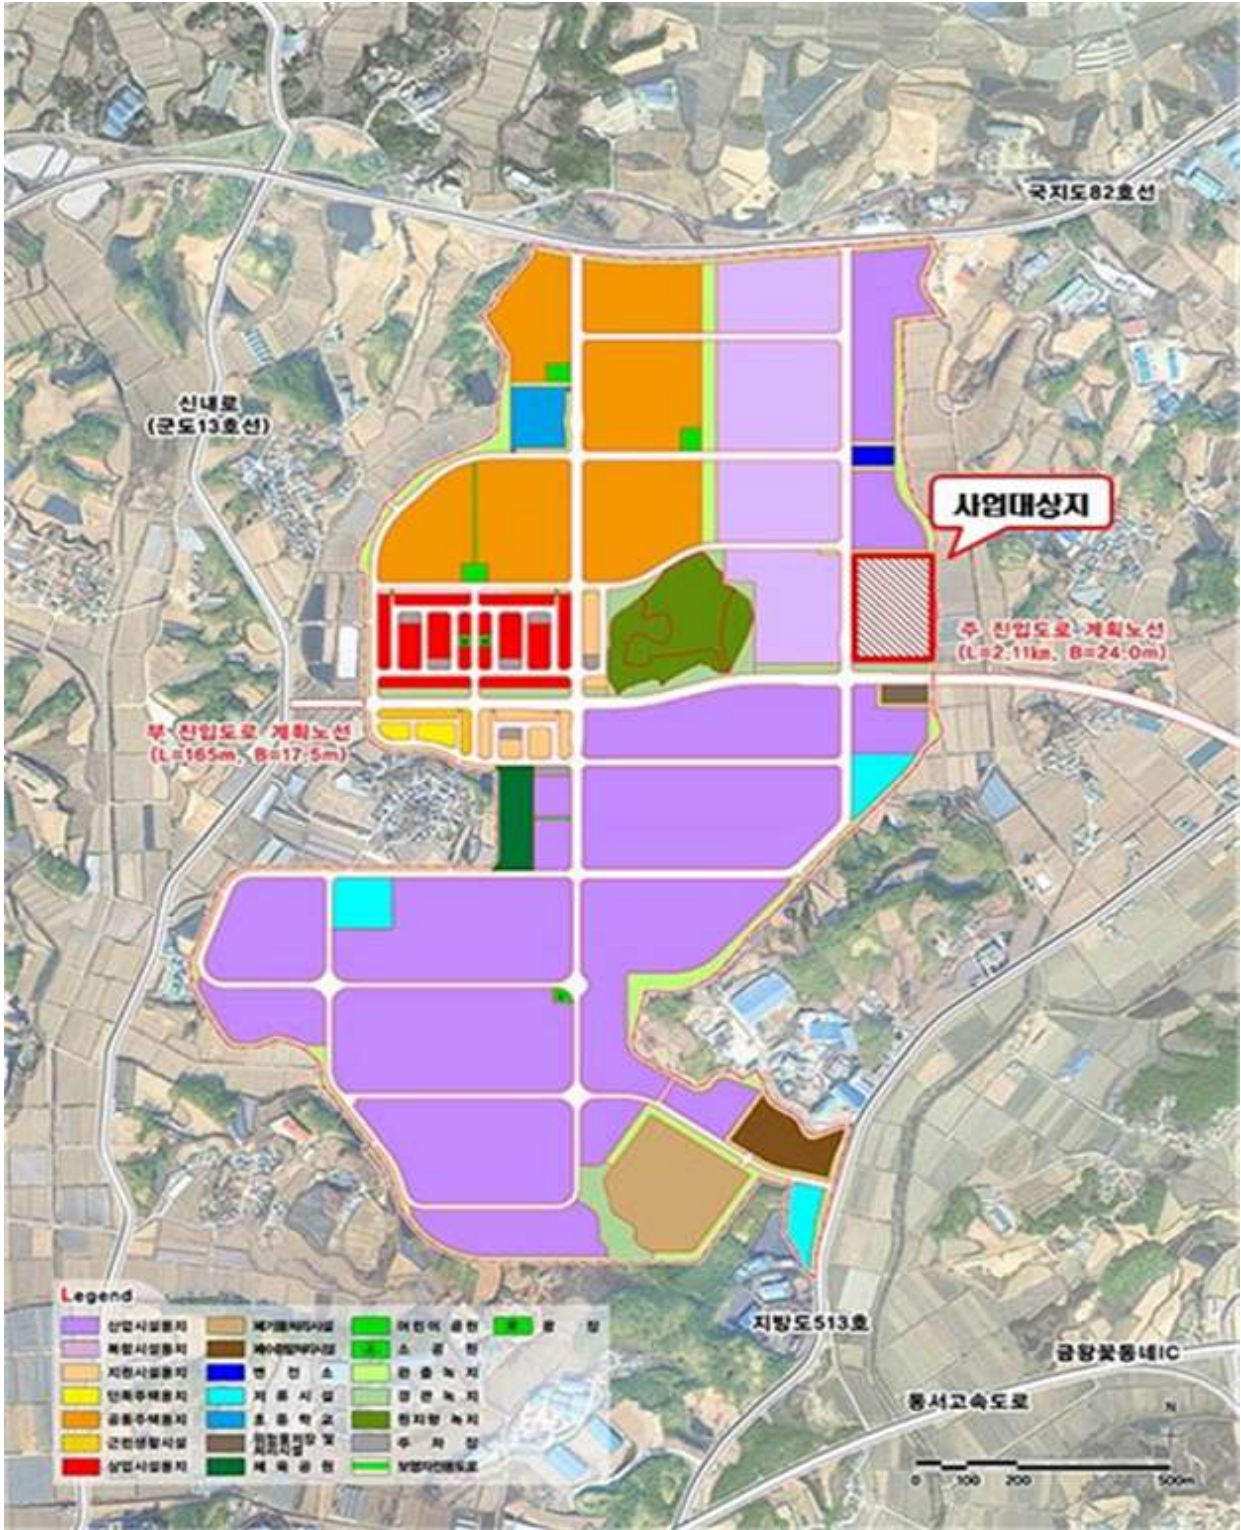

9. 충북혁신도시 공영주차장 조성사업

- ◆ 위치: 맹동면 동성리 486-1
- ◆ 사업기간: 2020. ~ 2022.
- ◆ 규모: 5,000㎡ / 주차 194면
- ◆ 총사업비: 5,900백만원 (균특 50%, 균비 50%)
- ◆ 사업내용: 충북혁신도시 공영주차장 조성
- ◆ 공정률(이행률): 50% ◆ 완료시기: 2022. 10.

☐ 추진상황

- | | |
|----------------|---------|
| ○ 실시설계용역 착수 | 20. 7. |
| ○ 주민설명회(1, 2차) | 21. 10. |
| ○ 착공 | 21. 12. |

☐ 향후계획

- 준공 22. 10.

☐ 투자계획

(단위: 백만원)

재원별	총사업비	기투자	2022확보	2023요구	2024이후
합 계	5,900	1,210	4,690	-	-
균 특	2,450	1,105	1,345	-	-
도 비	-	-	-	-	-
균 비	2,450	105	2,345	-	-
특교세	1,000	-	1,000	-	-

부서/팀	건설교통과 / 교통팀	담당자	시설7급 권형문	전화번호	871-3883
------	-------------	-----	----------	------	----------

위치도 및 조감도

□ 위치도



□ 사진대지



IV. 서면보고자료

1. 도로인프라 구축을 위한 군도 확포장사업

- 내부 도로망 확충으로 상급도로와의 접근성과 이동성 향상
- 효율적인 도로건설로 사통팔달의 중부권 핵심도시로 도약

□ 사업개요

(단위: km, 백만원)

사업명	위치	사업기간	사업량	사업비	비고
합계	4개 노선		3.8	2,050	
갑산-중동(군도 7호선)	소이 갑산	2022	0.6	500	공사+보상
한별-비산(군도 18호선)	음성 한별	2022	1.0	650	보상
내산-내산(군도 19호선)	대소 내산	2022	1.2	400	공사+보상
쌍봉-행제(군도 13호선)	금왕 쌍봉	2022	1.0	500	보상

□ 추진상황 및 향후계획

- 실시 설계 22. 1.
- 공사 착공 22. 3.
- 공사 준공 22. 12.

□ 기대효과

- 편리한 도로망 구축에 따른 지역발전의 불균형을 해소
- 상급도로와의 접근성 향상에 따른 물류비용 절감

부서/팀	건설교통과 / 도로팀	담당자	시설6급 김덕원	전화번호	871-3872
------	-------------	-----	----------	------	----------

2. 영농환경 개선을 위한 농어촌도로 건설사업

- 빠르고 안전한 농어촌도로 개설로 농·특산물의 원활한 운송 도모
- 물류비 절감 및 영농환경 개선으로 농가소득 증대 기여

□ 사업개요

(단위: km, 백만원)

사업명	위치	사업기간	사업량	사업비	비고
합계	8개 노선		5.8	3,500	
삼생-군자간 (면도 104호선)	음성 삼생	2022	0.4	200	보상
신천-하당간 (리도 211호선)	원남 하당	2022	0.5	300	공사
성본-부윤간 (리도 202호선)	대소 성본	2022	0.3	1,000	공사+보상
대정-대정간 (리도 210호선)	삼성 대정	2022	0.8	700	공사+보상
한별-한별간 (농도 303호선)	음성 한별	2022	0.6	200	보상
송곡-임곡간 (면도 102호선)	생극 송곡	2022	0.6	300	보상
문촌-상우간 (리도 104호선)	감곡 문촌	2022	1.5	400	공사+보상
통동-군자간 (리도 206호선)	맹동 통동	2022	1.1	400	보상

□ 추진상황 및 향후계획

- 실시 설계 22. 1.
- 공사 착공 22. 3.
- 공사 준공 22. 12.

□ 기대효과

- 농·특산물 유통 물류비 절감과 영농환경개선으로 농가소득증대
- 지역주민의 오랜 숙원사업을 해소하고 지역발전 도모

부서/팀	건설교통과 / 도로팀	담당자	시설6급 김덕원	전화번호	871-3872
------	-------------	-----	----------	------	----------

3. 안전하고 쾌적한 도로 유지관리

- 도로시설물의 신속한 정비로 도로이용객 편의 제공
- 교통취약 구간의 점검 및 신속한 보수로 편리한 보행환경 조성

□ 사업개요

(단위: 백만원)

사업명		위치	사업 기간	사업량	사업비	비고
합 계					3,260	
재해대비	제설, 수해 등	9개 읍면	2022	9개 읍면	350	
군 도 정비사업	도로유지보수	9개 읍면	2022	9개 읍면	500	27개노선
	표지판 정비	9개 읍면	2022	9개 읍면	200	
	마라톤구간정비	마라톤코스	2022	마라톤코스	50	
	차선도색	9개 읍면	2022	9개 읍면	300	
	아스콘덧씌우기	9개 읍면	2022	9개 읍면	200	
	배수로 등 기타	9개 읍면	2022	9개 읍면	80	
	도로유지보수	9개 읍면	2022	9개 읍면	300	233개노선
농어촌도로 정비사업	차선도색	9개 읍면	2022	9개 읍면	100	
	아스콘덧씌우기	9개 읍면	2022	9개 읍면	200	
	배수로 등 기타	9개 읍면	2022	9개 읍면	80	
	교량 정밀안전점검	5개소	2022	5개소	100	남촌교 등
	교량 내진성능평가	7개소	2022	7개소	100	선정교 등
	교량유지보수	55개소	2022	55개소	200	
	교량 내진성능보강사업	3개소	2022	3개소	400	삼생교 등
	보호구역 유지보수사업	9개 읍면	2022	107개소	100	

□ 추진상황 및 향후계획

- 군도 및 농어촌도로 유지보수 연중
- 차선도색 상·하반기
- 표지판정비 연중

□ 기대효과

- 도로시설물의 신속한 정비로 안전하고 편리한 도로환경 조성
- 보행자의 안전 확보와 교통사고 사전예방

부서/팀	건설교통과 / 도로팀	담당자	시설7급 김병규	전화번호	871-3873
------	-------------	-----	----------	------	----------
